Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence du Numérique
de la Sécurité Civile

Trajectoire de déploiement 2023

NexSIS 18 112

SI des Secours de nouvelle génération

Le 1er juillet 2022

Points d'actualités

- Avancement de la réalisation de NexSIS 18-112
- Calendrier SECOURIR
- Les travaux de déploiement du SDIS 77
- Point sur les recrutements
- Budget
- ….

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Agence du Numérique de la Sécurité Civile

Planning rapport déploiement

Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27
23 au 27 mai	30 mai au 3 juin	6 juin au 10 juin	13 juin au 17 juin	20 au 24 juin	27 juin au 1er juillet	4 juillet au 8 juillet

1er juin
Atelier trajectoire

Ajustement des demandes depuis le 15 mars

9 juin
Réunion avec les SIS 2023-2024
Ex 2021-2022

15 juin
Pré CA

1er juillet
Réunion avec les SIS 2025
Ex 2023

5 juillet
CA

Pesage des fonctionnalités SIS pilotes, 78, 95 et BSPP

1er juillet
COOD

Visites de sites SDIS ex 2023

Rédaction du rapport de délibération

Principales caractéristiques des SDIS pilotes

Caractéristiques	SIS 2A	SDIS 37	SDIS 44	SDIS 67	SDIS 83	SDIS 91
Contraintes techniques	Pas de contrainte majeure	Obsolescence des matériels	Pas de contrainte majeure	Pas de contrainte majeure	Obsolescence des matériels et des systèmes	Pas de contrainte majeure
MCO	Contrat se termine fin 2022. Prolongation en cours de négociation.	Augmentation du cout de maintenance	Fin de contrat de maintenance 31/12/2023	Pas de contrainte majeure	Maintenance impossible des matériels obsolètes Pérennité de l'éditeur	Pas de problème majeur
Disponibilité des fonctionnalités nécessaires au démarrage à la date de bascule	Les travaux d'analyse ne montrent pas de point bloquant	Les travaux d'analyse ne montrent pas de point bloquant	Le SDIS 44 bénéficie d'un SGO mature. Attendre NexSIS version fin 2023	La version 2 de NexSIS semble nécessaire	Les travaux d'analyse ne montrent pas de point bloquant	Le SDIS 91 bénéficie d'un SGO mature. Attendre NexSIS version fin 2023

Principales caractéristiques des SDIS

Caractéristiques	BSPP	SIS 07	SDIS 09	SDIS 28	SDIS 31	SDIS 34	SDIS 46
Contraintes techniques	Pas de contrainte majeure	Obsolescence des matériels	Emplacement des futurs locaux techniques	Infrastructure en fin de vie	Pas de contrainte majeure	Pas de contrainte majeure	Obsolescence des matériels
MCO	MCO interne Evolution des fonctionnalités très limitée	Contrat cadre qui se termine fin 2022	Pas de contrainte majeure	Possible de prolonger mais sans connaitre le surcout	Pas de contrainte majeure	Pas de contrainte majeure	Plus de maintenance matérielle Augmentation du cout
Disponibilités des fonctionnalités nécessaires au démarrage à la date de bascule	Pas de gestion individuelle Pas de SIG opérationnel Peu de fonctionnalité avec ADAGIO	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	SGO actuel évolué	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Agence du Numérique de la Sécurité Civile

Principales caractéristiques des SDIS

Caractéristiques	SIS 50	SDIS 58	SDIS 79	SDIS 89	SDIS 974	SDIS 78	SDIS 95
Contraintes techniques	Pas de contrainte majeure	Obsolescence des matériels	Pas de contrainte majeure	Pas de contrainte majeure	Système fragile	Système fragile	Pas de contrainte majeure
MCO	Pas de contrainte majeure	Augmentation du cout Investissement matériel important à prévoir	Pas de contrainte majeure	Pas de contrainte majeure	MCO interne	Plus de maintenance matériel	Pas de contrainte majeure
Disponibilité des fonctionnalités nécessaires au démarrage à la date de bascule	Un SI avec beaucoup d'interfaces	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	Pas de contrainte majeure détectée lors de l'étude préalable	Absence de SGA/SGO	Les travaux d'analyse ne montrent pas de point bloquant	Un SI avec beaucoup d'interface Le SDIS 95 bénéficie d'un SGO mature. Attendre NexSIS version fin 2023

Capacité de mise en production 2023

Disponibilité des infrastructures locales

9 infras commandées et disponibles :

Installées : ANSC, 77, 37, 91 et 83

Reste 4 à ventiler en fonction de la trajectoire

Commande de 3 infrastructures locales possible suite passage au BR2

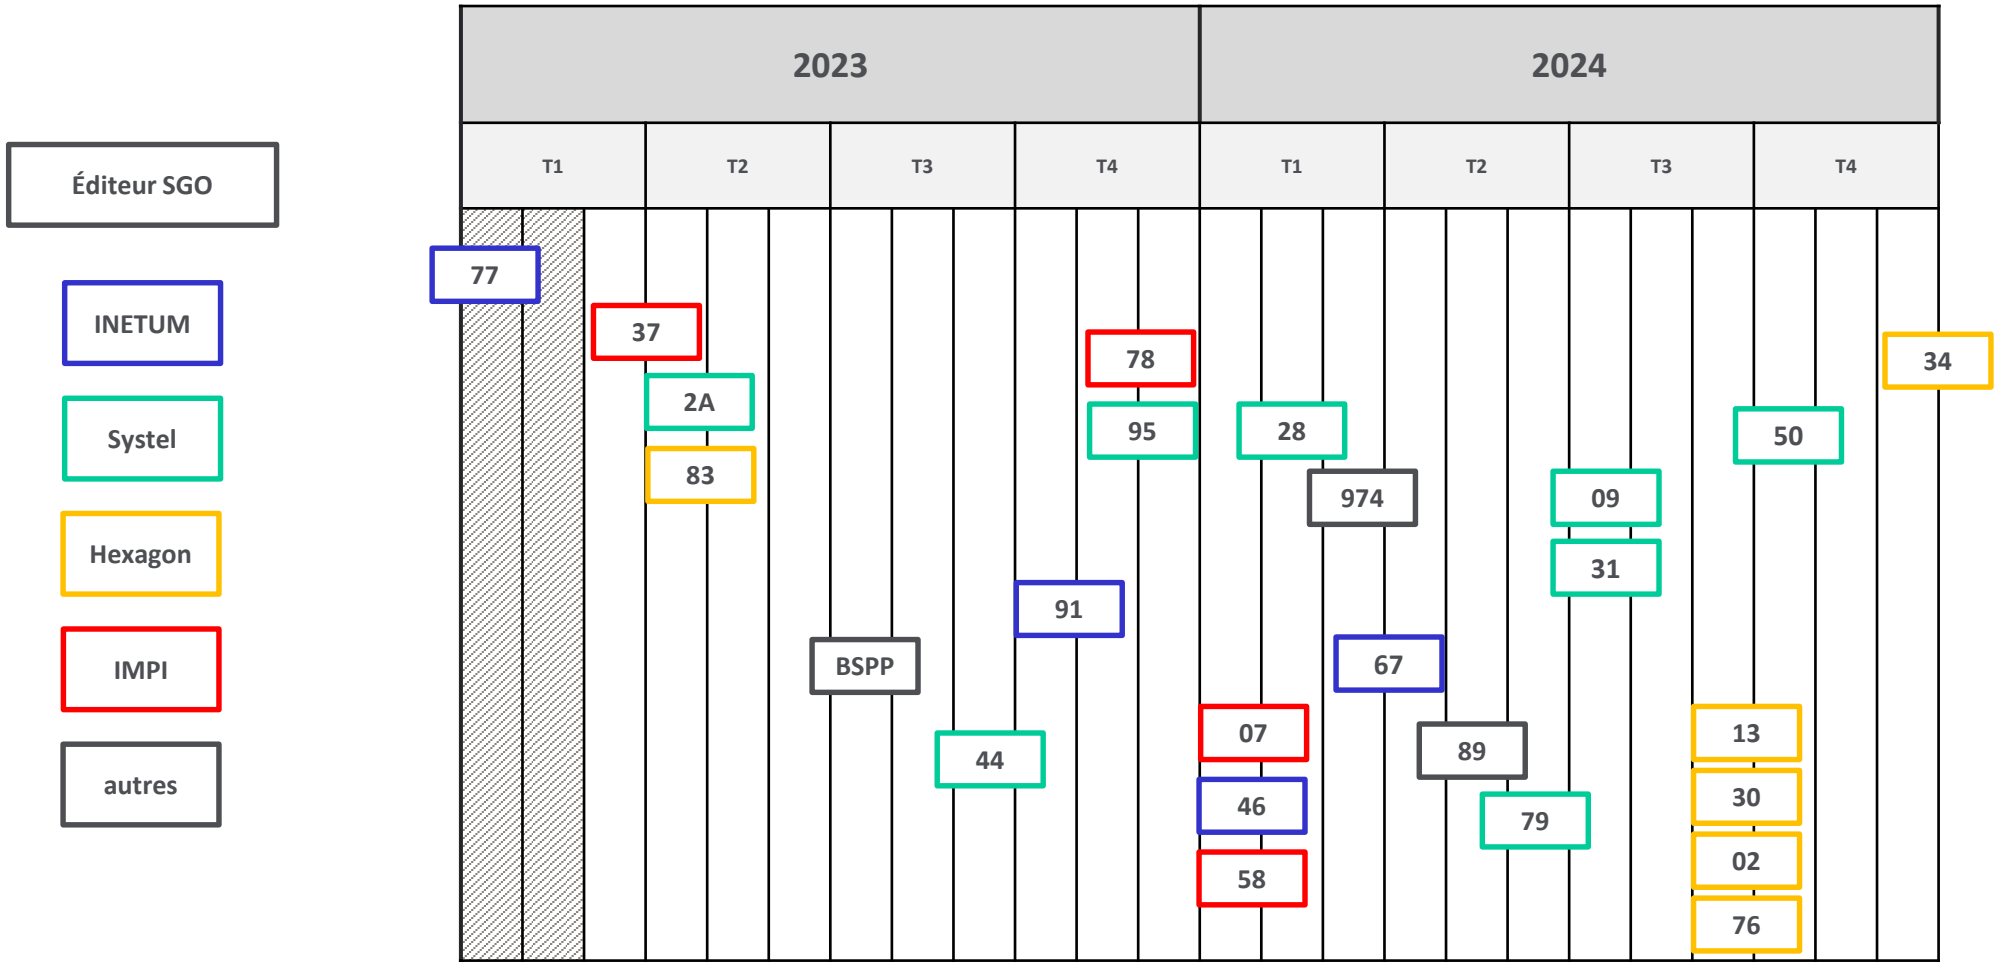
Éditeur SGO
INETUM
Systel
Hexagon
IMPI
autres
2023
2024
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
77
37
2A
83
BSPP
44
91
78
95
07
46
58
28
974
67
89
79
09
31
13
30
02
76
50
34

Estimation de charge ANSC focalisée sur les bascules en production

Les principales phases :

légende

Mise à disposition des infrastructures locales (MAD infra)	Jalon qui correspond à la mise à disposition des infrastructures locales, à leur connexion au système d'information du SIS et au RIE permettant l'accès aux environnements NexSIS 18-112 du SIS
Mise en ordre de marche (MOM)	mise à disposition de l'infrastructure locale (jalon précédent) et de Secourir
NexSIS disponible pour bascule en production	Jalon consécutif à la réalisation de l'ensemble des actions nécessaires au passage en production. La phase de recette globale peut être lancée
Recette d'intégration (vérification d'aptitude au bon fonctionnement)	Phase de vérification globale de l 'ensemble des composants NexSIS. C'est de la responsabilité du SDIS, accompagné et assisté par l'ANSC. La durée et la méthode sont variables et à la main du SDIS (durée estimée 2 mois)
Bascule en production	Mobilisation forte des équipes de l'ANSC : déploiement, technique et développement
Vérification de service régulier (VSR)	Phase consécutive à la bascule en production durant laquelle l'accompagnement de l'ANSC se fait toujours en mode projet
Maintien en condition opérationnelle (MCO)	Fin du mode projet, le SDIS rentre en exploitation dans le cadre du maintien en condition opérationnelle tel que défini dans le contrat de service avec notamment le support utilisateur
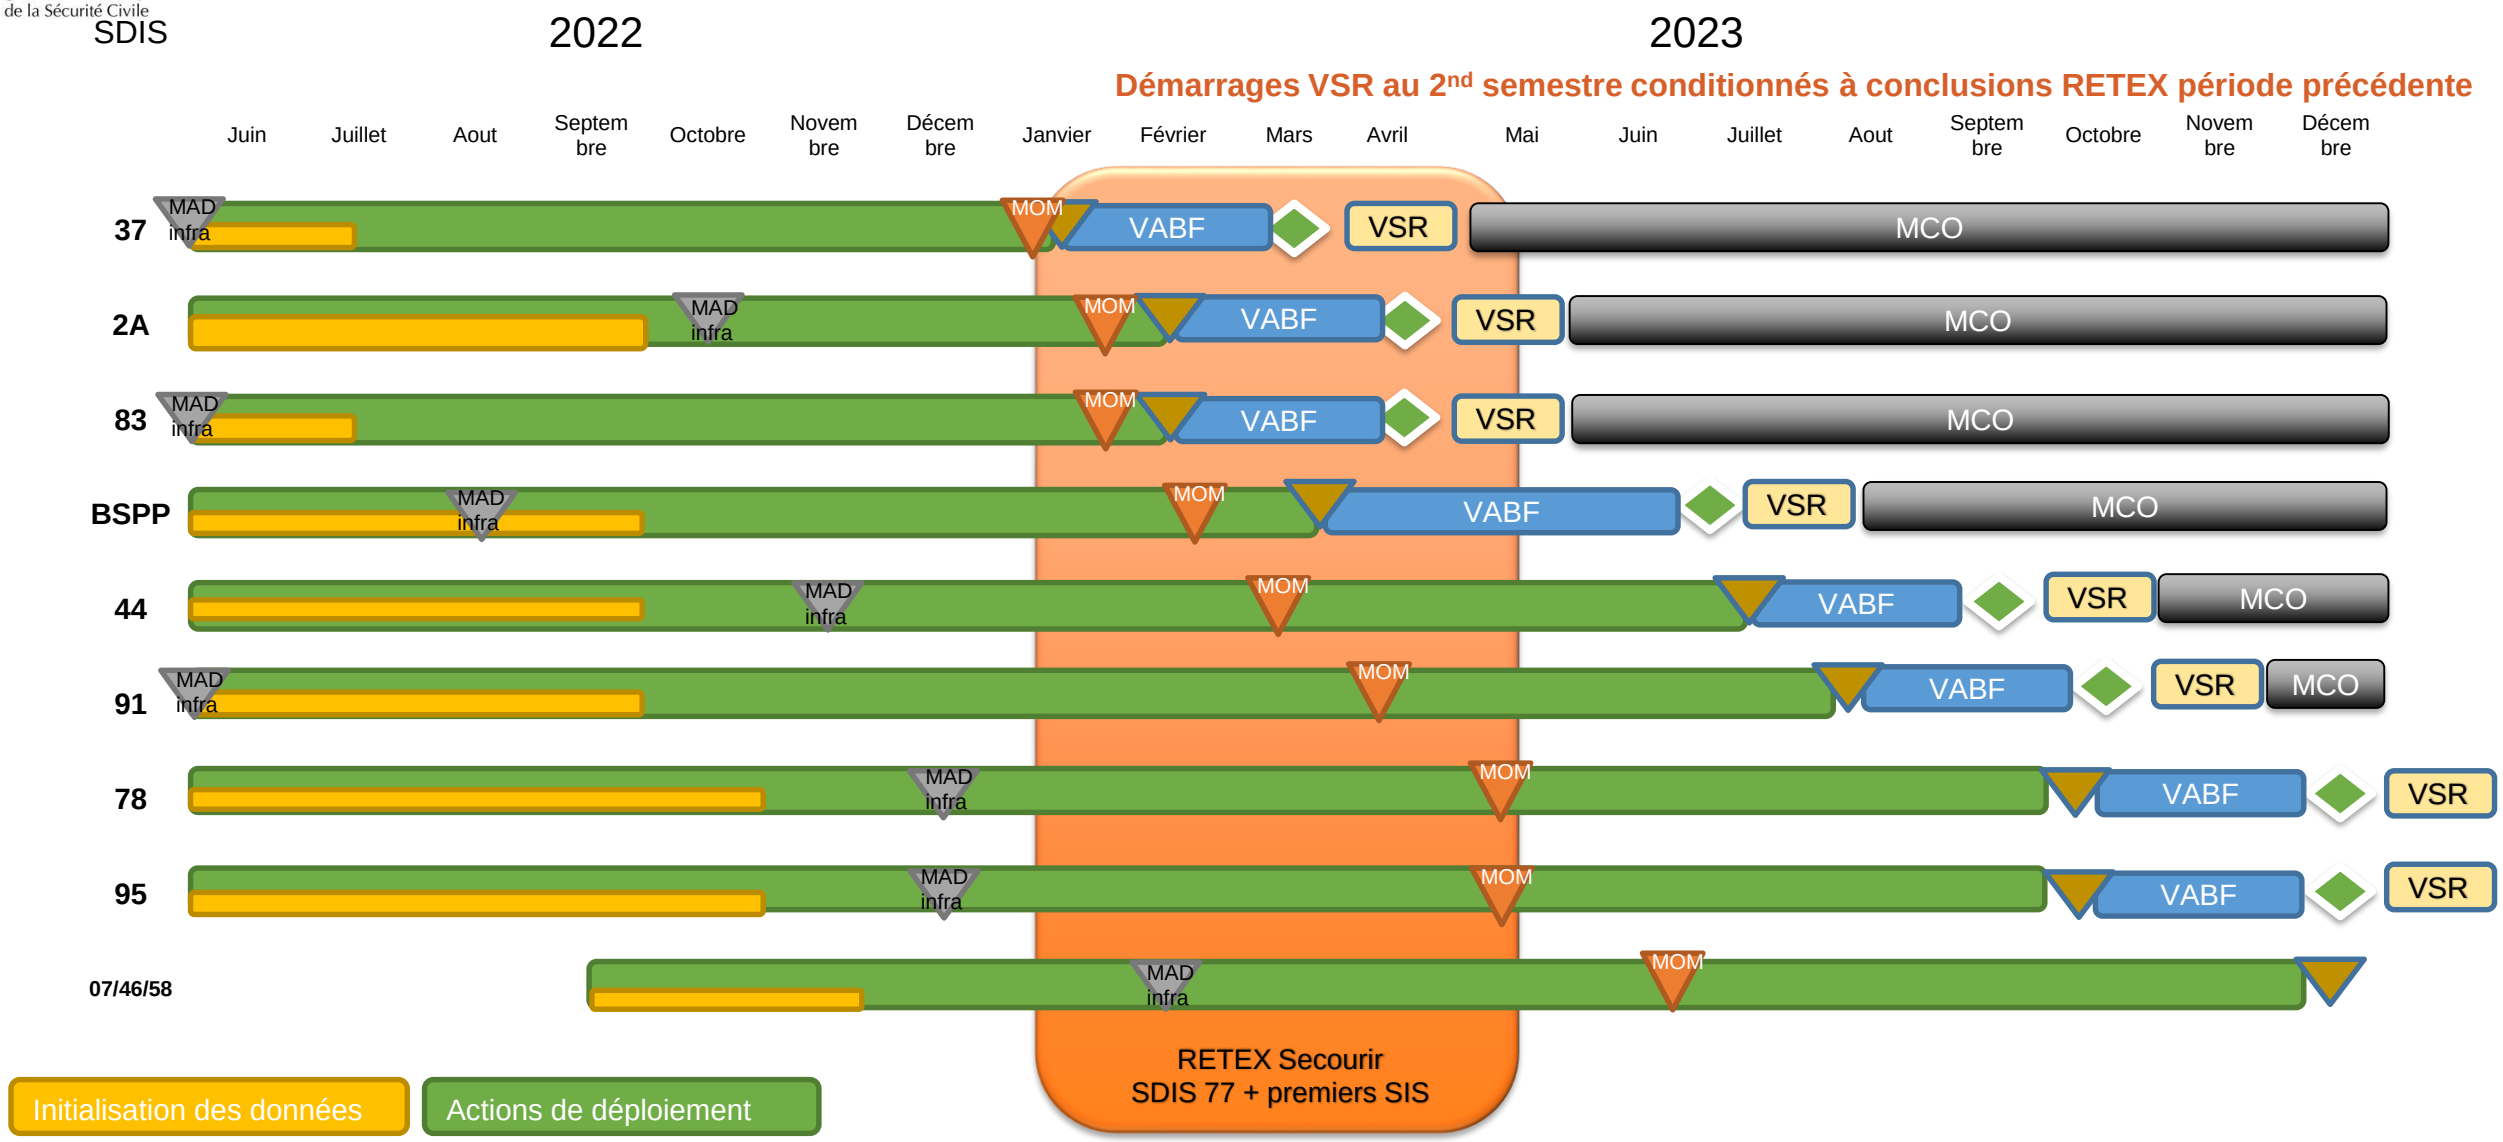
Macro planning 2023 (taches vue ANSC)
